


Verkehrsmonitoring Zürich Nord, Faktenblatt


Messstellen-ID	O0518
Knoten Nr.	unbekannt
Ort	Zürich Hardturm (AB)
Typ	NAN
Richtung 1 (R1)	Einfahrt ZH Bernerstrasse
Richtung 2 (R2)	Ausfahrt Richtung Limmattalerkreuz Bernerstrasse
Richtung 3 (R3)	Richtung Zürich
Richtung 4 (R4)	Richtung Limmattalerkreuz
Zeitraum	Von 2023-01-01 bis 2023-12-31
Bauphase	0

Kennwerte		R1	R2	R3	R4	QS	SV-Anteil
alle Tage							
DTV	[Fz/d]	153	3'992	13'175	14'335	31'655	
DTV-16 6-22 Uhr	[Fz/16h]	131	3'663	11'432	12'341	27'567	
DTV-8 22-6 Uhr	[Fz/8h]	23	349	1'807	2'063	4'242	
Werktage (Mo-Fr)							
DWV	[Fz/d]	163	4'446	13'372	14'946	32'927	
DWV-16 6-22 Uhr	[Fz/16h]	131	3'663	11'432	12'341	27'567	
DWV-8 22-6 Uhr	[Fz/8h]	23	349	1'807	2'063	4'242	
MSP 7-8 Uhr	[Fz/h]	9	210	921	652	1'792	
ASP 17-18 Uhr	[Fz/h]	10	465	768	1'374	2'617	

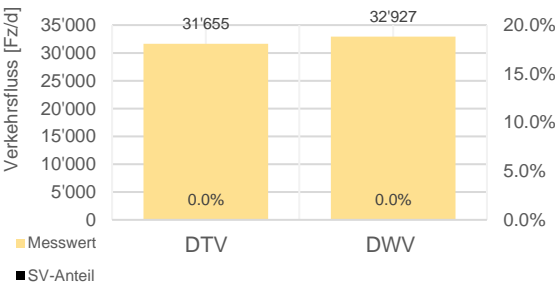


Messwert	SV-Anteil
DTV	0.0%
DWV	0.0%

Wochenganglinie		R1	R2	R3	R4	QS	SV-Anteil
Montag	[Fz/d]	137	3'978	12'366	13'483	29'964	
Dienstag	[Fz/d]	182	4'465	12'827	14'701	32'175	
Mittwoch	[Fz/d]	168	4'655	13'546	15'276	33'645	
Donnerstag	[Fz/d]	171	4'574	13'587	15'511	33'843	
Freitag	[Fz/d]	155	4'557	14'527	15'750	34'989	
Samstag	[Fz/d]	142	3'334	14'299	14'217	31'992	
Sonntag	[Fz/d]	117	2'399	11'108	11'441	25'065	



Tag	R3	R4
1	137	3'978
2	182	4'465
3	168	4'655
4	171	4'574
5	155	4'557
6	142	3'334
7	117	2'399

Entwicklung DWV über Zeit

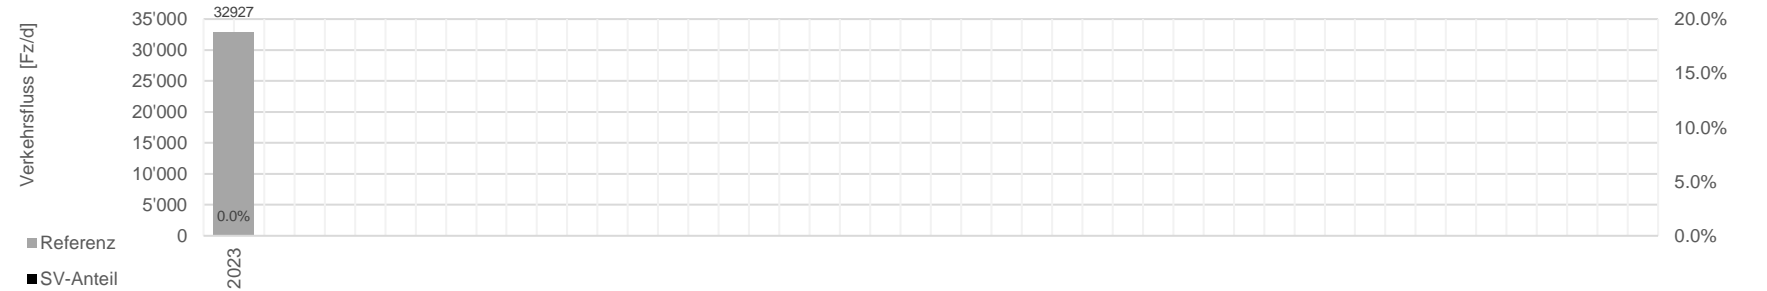

Kommentare/Beobachtungen
